

Baustellenkoordination





...der Stadt Schaffhausen



SH POWER

Beteiligte


Intern (SH Power)

- Strom
- Gas
- Wasser
- Siedlungsentwässerung
- Fernwärme- /kälte


Extern

- EKS
- TSH
- GrünSH
- Sasag
- Swisscom
- VBSH
- ETAWATT
- AXPO
- ASTRA
- SBB

Viele Beteiligte / Eine Plattform

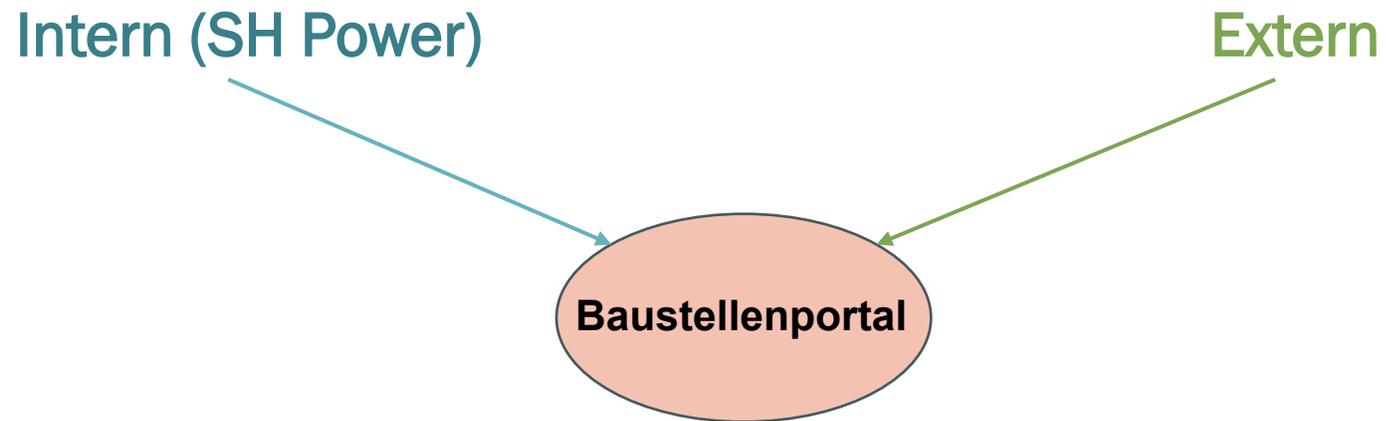



GIS



Fachschale
Baustellenportal

WebGIS

GIS




Editier-Projekt
View-Projekt

Fachschale
Baustellenportal

WebGIS

GIS

Internet

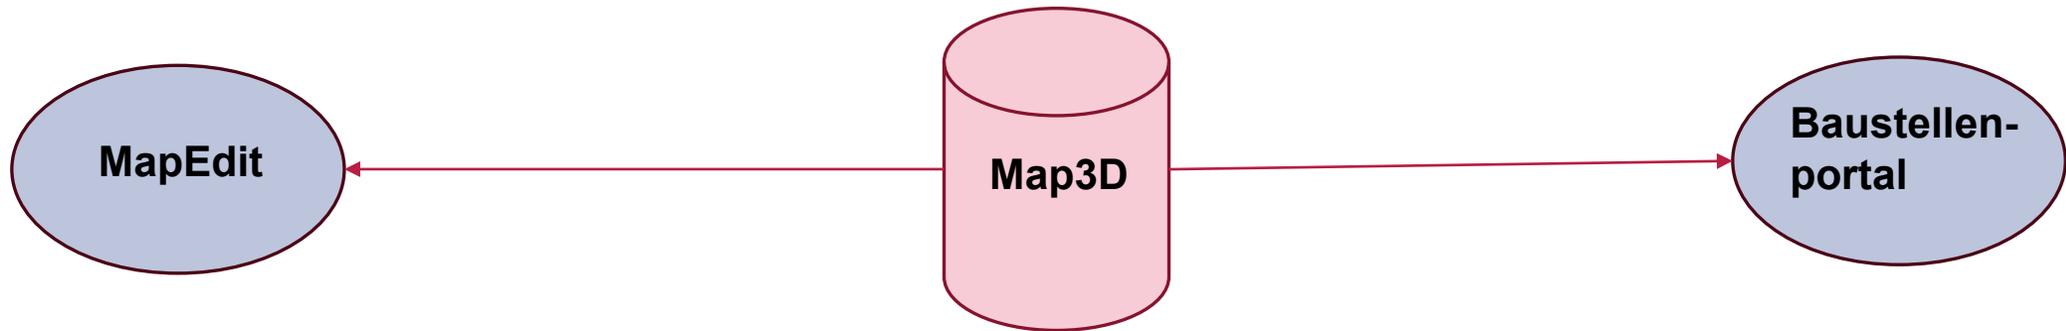


Editier-Projekt
View-Projekt

Fachschale
Baustellenportal


WebGIS

GIS


Internet

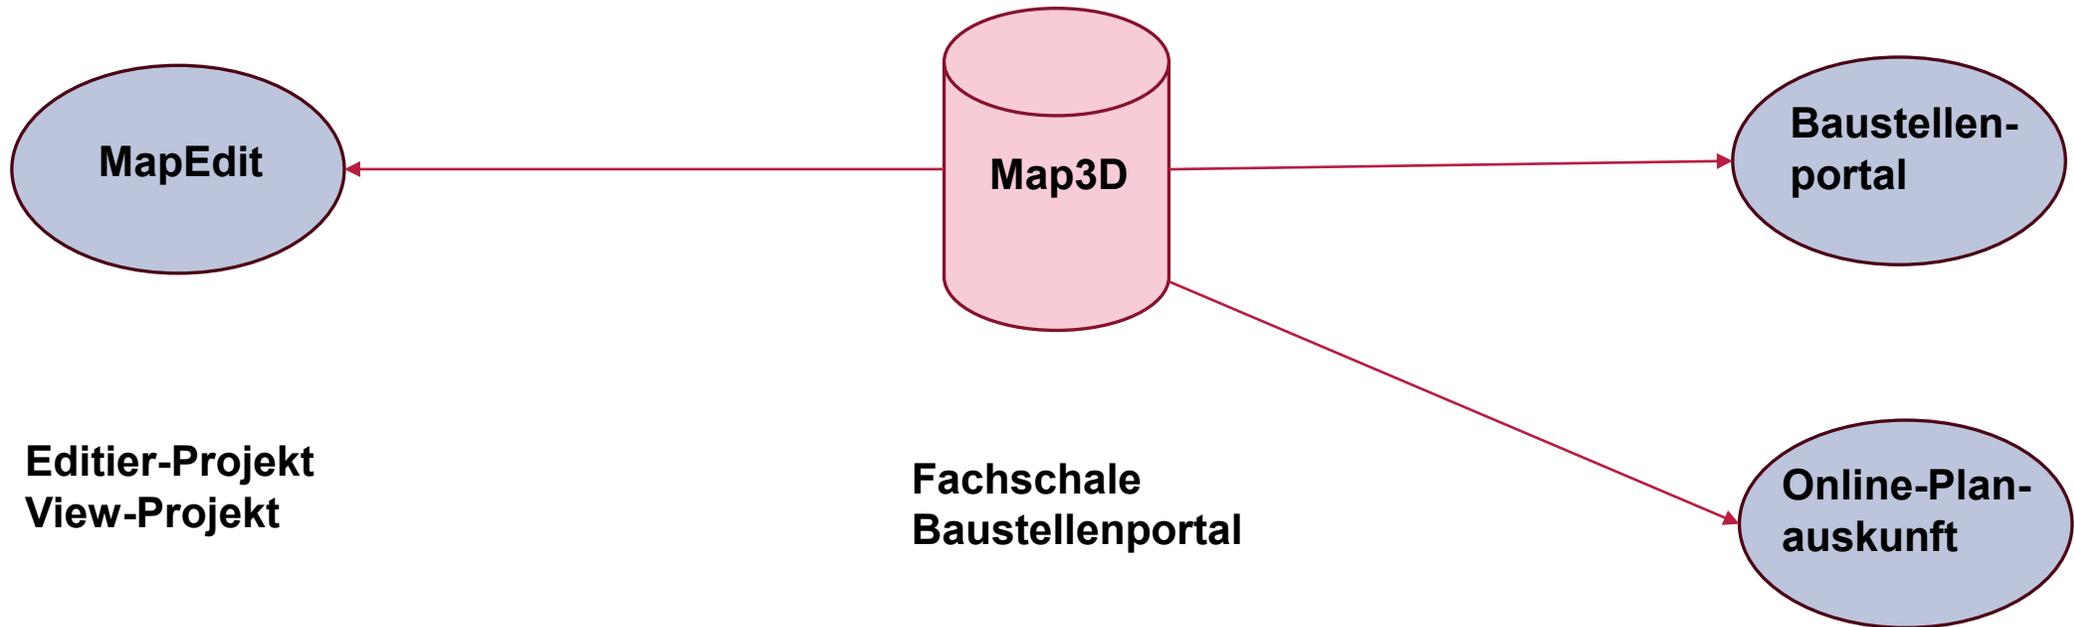

Baustellenportal

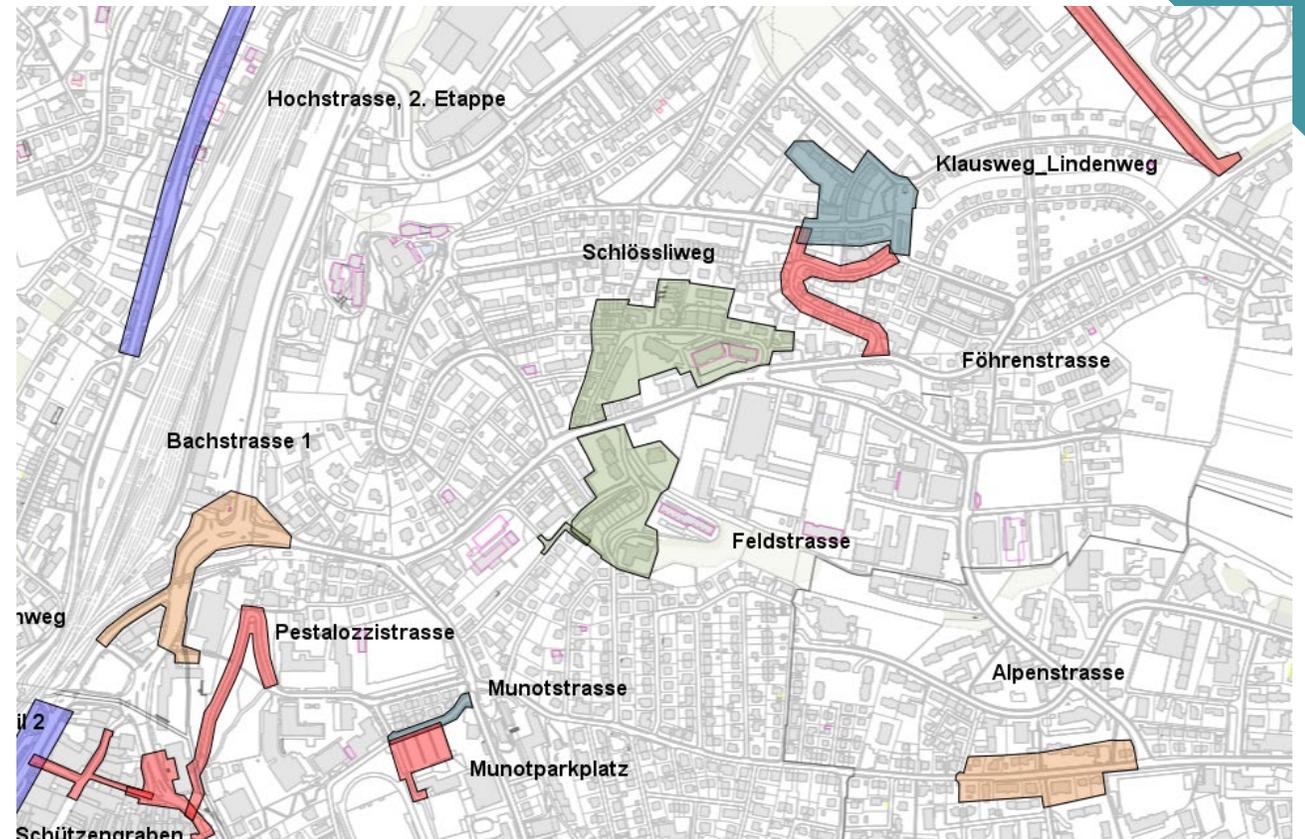

Baustellenportal

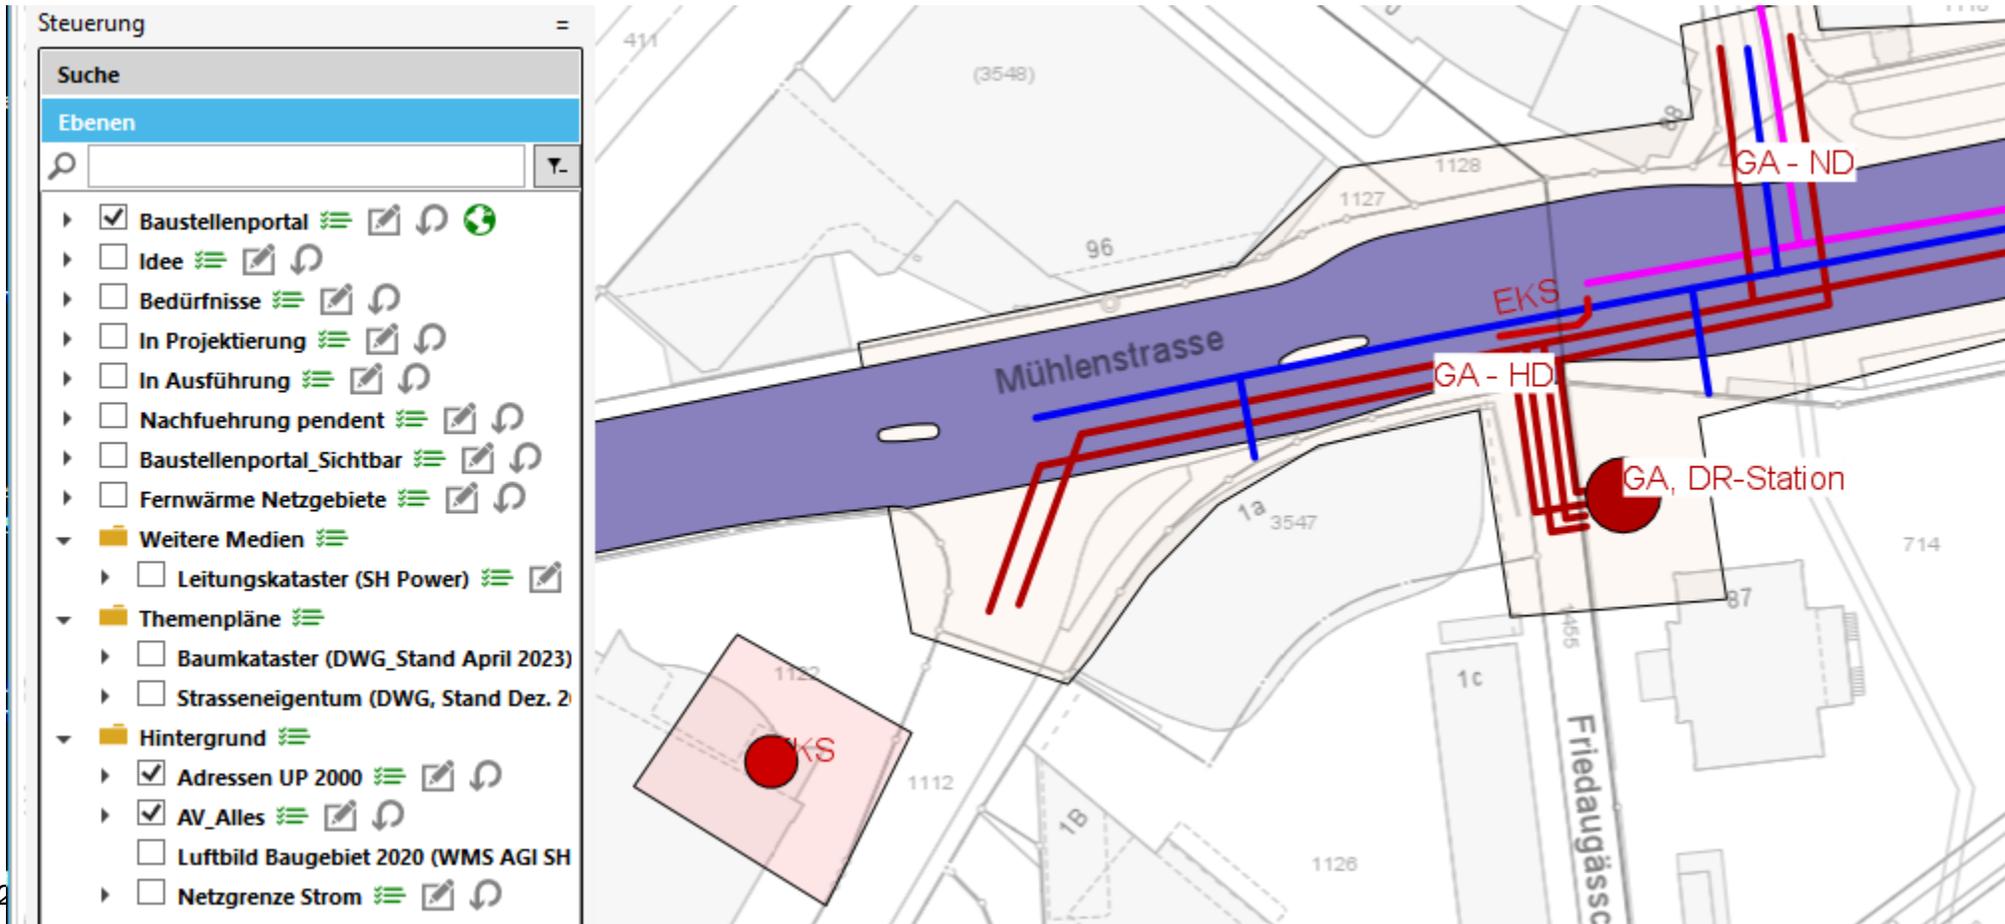

Baustellenportal

Daten Projekt

PROJEKT

Formular Vernehmlassung Nachführung Tabellenansicht

Gemeinde: Schaffhausen Kontrolliert: Yes FID: 2470

Projektname: Langhansergässchen

Projektname_Zusatz:

Bereich: Riethaldenweg bis Etzelstrasse

Abacus Sammelnummer: Sichtbarkeit:

Status: In Projektierung Erfasst von: Nikolina Oreskovic

Budgetjahr: 2023 Priorität: 1

Bauleiter-Modell:

Bauleiter: Urs Leu Baubeginn: 01.05.2024

Telefon_Nr: 052 635 14 52 Bauende ca.:

Unternehmer:

Bemerkungen:

Hinweis Öffentlichkeit: 1. Etappe Wasser Baustart Februar 2024

Beteiligte / Teilprojekte

AW: Ja <input type="text"/>	<input type="button" value="..."/> <input type="button" value="→"/>	EKS: Nein <input type="text"/>	<input type="button" value="..."/> <input type="button" value="→"/>	Etawatt: <input type="text"/>	<input type="text"/>
EW: Ja <input type="text"/>	<input type="button" value="..."/> <input type="button" value="→"/>	TSH: Ja <input type="text"/>	<input type="button" value="..."/> <input type="button" value="→"/>	VBSH: <input type="text"/>	<input type="text"/>
FW: Nein <input type="text"/>	<input type="button" value="..."/> <input type="button" value="→"/>	Grün SH: Nein <input type="text"/>	<input type="button" value="..."/> <input type="button" value="→"/>	AXPO: <input type="text"/>	<input type="text"/>
GA: Ja <input type="text"/>	<input type="button" value="..."/> <input type="button" value="→"/>	Sasag: <input type="text"/>	<input type="text"/>	ASTRA: <input type="text"/>	<input type="text"/>
WA: Ja <input type="text"/>	<input type="button" value="..."/> <input type="button" value="→"/>	Swisscom: <input type="text"/>	<input type="text"/>	SBB: <input type="text"/>	<input type="text"/>

Baustellenportal

Daten Teilprojekt

Es können pro Medium mehrere Teilprojekte angelegt werden.

The screenshot shows a web application window titled 'TEILPROJEKT_AW' with a 'Tabellenansicht' tab. The main heading is 'Teilprojekt Abwasser'. The form contains the following fields and values:

- Projekt: Langhansergässchen (dropdown menu)
- FID: 5896 (text input)
- Budget/Projektnr.: 2164352 (text input)
- Teilprojekt: Riethaldenweg bis Etzelstrasse (text input)
- Massnahmen: Neubau (dropdown menu)
- Baujahr geplant: (text input)
- Bauliches Objekt: Sammelkanal (dropdown menu)
- Baujahr best. Ltg.: 1929 (text input)
- Nutzungsart: Mischabwasser (dropdown menu)
- Projektleiter: Nicola Bulant (dropdown menu)
- Entwaesserungssystem: Mischsystem (dropdown menu)
- Kostenschätzung Fr.: 150000 (text input)
- Länge: 86 m (text input)
- Fläche: m2 (text input)
- Bemerkungen: (empty text area)

Baustellenportal

Bedürfnisserfassung



Vernehmlassung



Budget



Projekt



Ausführung



Nachführung



Baustellenportal

Bedürfnisserfassung



Vernehmlassung



Budget



Projekt



Ausführung



Nachführung

ular Vernehmlassung Nachführung Tabellenansicht

Gemeinde: Schaffhausen FID: 2317

Projektname: Querstrasse

Bereich: Lochstrasse bis Kehrplatz

Abacus Sammelnummer:

Vernehmlassung

Frist bis 31.12.2023 ..

Medium	Erledigt	Bedarf	Teilprojekt	Medium	Erledigt	Bedarf	Teilprojekt
AW	25.08.2023 ..	Ja	... →	EKS	..	Nein	... →
EW	30.08.2023 ..	Nein	... →	TSH	..	Nein	... →
FW	..	Nein	... →	Grün SH	..	Nein	... →
GA	..	Nein	... →	SASAG	..		
WA	16.08.2023 ..	Ja	... →	SWISSCOM	..		
				ETAWATT	..		
				VBSH	..		

Falls eine Massnahme geplant ist, muss ein Teilprojekt erfasst werden.

Baustellenportal

Bedürfnisserfassung



Vernehmlassung



Budget



Projekt



Ausführung



Nachführung

Gemeinde:	Neuhausen	Kontrolliert:		FID:	5995
Projektname:	Hohrainstrasse				
Projektname_Zusatz:					
Bereich:	Zoll- bis Chlaffentalstrasse				
Abacus Sammelnummer:				Sichtbarkeit:	
Status:	Budget	Erfasst von:	Nikolina Oreskovic		
Budgetjahr:	2025	Priorität:			
Bauleiter-Modell:	ÖFFNEN	ÜBERNEHMEN	Baubeginn:		
Bauleiter:					
Telefon_Nr:					
			Bauende ca.:		
			Unternehmer:		

Baustellenportal

Bedürfnisserfassung



Vernehmlassung



Budget



Projekt



Ausführung



Nachführung



Baustellenportal

Bedürfnisserfassung



Vernehmlassung



Budget



Projekt



Ausführung



Nachführung

The screenshot shows a web application window titled 'PROJEKT'. It has a blue header bar with a globe icon and a search icon. Below the header, there are three tabs: 'Formular' (selected), 'Vernehmlassung', and 'Tabellenansicht'. The main content area is a form with the following fields:

- Gemeinde: Schaffhausen (dropdown)
- Kontrolliert: (checkbox)
- FID: 1477
- Projektname: Schildgutstrasse
- Projektname_Zusatz: 2. Etappe
- Bereich: Bühlstrosse 15 bis Stockarbergstrasse
- Abacus Sammelnummer: (empty)
- Sichtbarkeit: (dropdown)
- Status: In Ausführung (dropdown)
- Erfasst von: Nikolina Oreskovic (dropdown)
- Budgetjahr: 2023
- Priorität: 1 (dropdown)
- Bauleiter-Modell: ÖFFNEN, ÜBERNEHMEN (buttons)
- Baubeginn: 30.10.2023
- Bauleiter: Urs Leu
- Bauende ca.: (empty)
- Telefon_Nr: 052 635 14 52
- Unternehmer: Walo (dropdown)

Baustellenportal

Bedürfnisserfassung



Vernehmlassung



Budget



Projekt



Ausführung



Nachführung

Gemeinde: Kontrolliert: FID:

Projektname:

Projektname_Zusatz:

Bereich:

Abacus Sammelnummer: Sichtbarkeit:

Nachführung GIS erledigt

AW: GA:

EW: WA:

FW:

FWK:

Sobald alle Medien nachgefüllt sind, Status auf 'Realisiert' setzen.


Baustellenportal

Das A & O

Organisation

Projektphase	Tätigkeit	Wer	
		GTB	Fachstelle Intern/Extern
Bedürfnis	Erstellen Projekt, Teilprojekt (Projektstrich), Vernehmlassung auslösen.	x	x
Vernehmlassung	Datum erfassen, sobald Vernehmlassung erledigt, Teilprojekt anlegen, falls nötig.	x	x
	Kontrolle Vernehmlassung	x	
Budget	Budgetjahr/Priorität erfassen	x	
Projektierung	Unternehmer, Bauleiter, Chefmonteur, Baustart, Bauende, Projektnummern, erfassen. Definitiver Projektperimeter erfassen	x	
Ausführung	Allenfalls Termin Bauende anpassen.	x	
Realisiert-Nachführung pendent	Sobald Baustelle beendet.	x	
Realisiert	Sobald alle GIS-Nachträge erledigt sind. (Status Anpassung durch GIS-Team)	x	

Öffentliche Baustellenübersicht

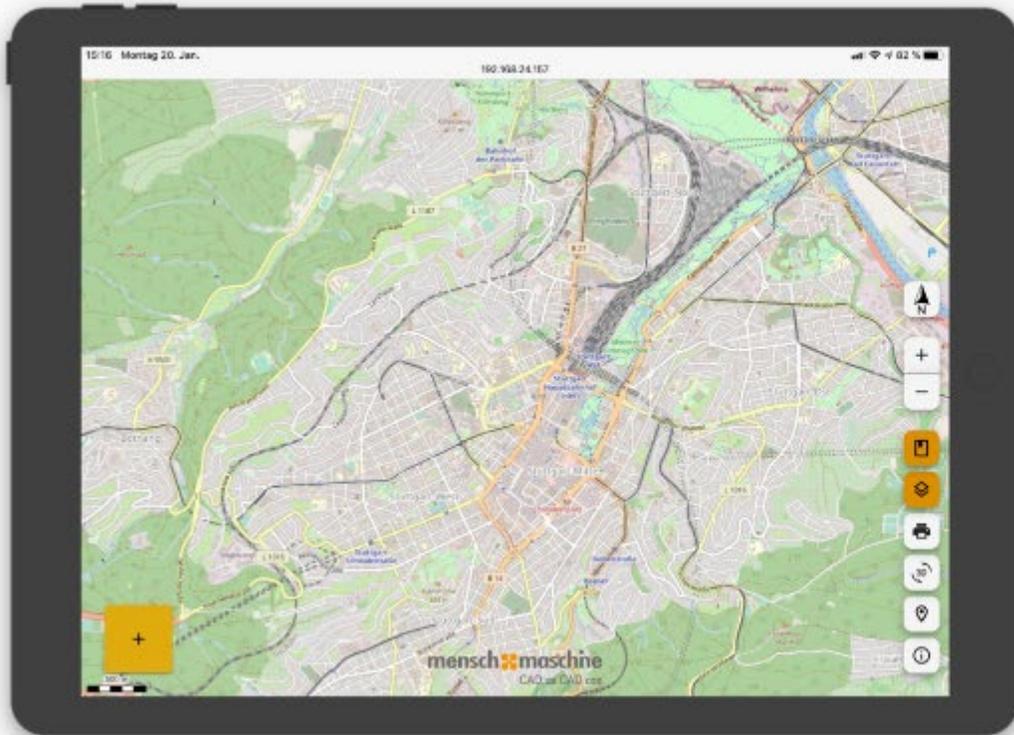

MapEdit

PORTAL

Eine Full Responsive Web-GIS-Lösung, die für «nicht GIS-Anwender» konzipiert wurde. Die intuitiv bedienbare Oberfläche ermöglicht es jedem Nutzer, sich schnell zurechtzufinden. MapEdit Portal soll als Auskunftssystem dienen und findet Anwendung als Gemeinde- oder Bürger-GIS. Diese App ist auf allen gängigen mobilen Endgeräten lauffähig.

Baustellenportal



Internetseite für die Öffentlichkeit mit Infos zu Baustellen (SH/NH)

Seit Anfang 2024 in Betrieb

<https://baustellen.shpower.ch>

Baustellenportal

	Hohlenbaumstrasse Schaffhausen
Ausführung	Wir bauen, damit wir Sie heute und in Zukunft zuverlässig versorgen können. Hier finden Sie Informationen zum Bauprojekt: Hohlenbaumstrasse
Status	In Ausführung
Auskunft	Nathan Neukom
Telefon	 052 635 13 78
Mail	 BAUSTELLEN@SHPOWER.CH
Dokument 1	
Dokument 2	
Einschränkungen	Strassen im Perimeter sind für den Verkehr abschnittsweise gesperrt. Wir sind bestrebt, die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Für allfällige Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Verständnis.



Information Leitungsbauarbeiten

24. Januar 2024

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner

Damit wir die Stadt und die Region Schaffhausen zuverlässig mit Energie und Wasser versorgen und das Abwasser sicher wegführen können, realisieren wir kontinuierlich Projekte zur Erneuerung und dem Ausbau unserer Netze. Wie wir Ihnen mitgeteilt haben, führen wir demnächst Leitungsbauarbeiten an Ihrer Strasse oder im näheren Umkreis davon aus.

Projektinformationen

 Bauarbeiten	Erneuerung der Kanalisation, Wasser-, Gas- und Stromleitungen sowie Strasseninstandstellung.
 Bauperimeter	Hohlenbaumstrasse, hinter Kindergarten Neubrunn
 Zeitraum	12. Februar 2024 bis voraussichtlich Ende Juni 2024
 Einschränkungen	Während der Bauarbeiten sind gewisse Beeinträchtigungen für die Anwohner nicht zu vermeiden. Die Zufahrten zu den Liegenschaften und Garagen werden teilweise nur erschwert oder gar nicht möglich sein. Der Baupolier wird sich frühzeitig mit Ihnen in Verbindung setzen, falls Ihre Abstellplätze oder Garagen nicht benutzt werden können. Die Verkehrsbeschilderung wird während der Bauarbeiten, je nach Baufortschritt und je nach Anlass, von der Stadtpolizei entsprechend angepasst. Ihren Kehricht können Sie, wie gewohnt, an den Abfuhrtagen deponieren, bei Bedarf wird das Baustellenpersonal das Verschieben des Kehrichts vornehmen.

Den Plan des Bauperimeters finden Sie auf der Rückseite.

Wir sind bestrebt, die Auswirkungen der Baustelle für Sie so gering wie möglich zu halten. Für allfällige Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Verständnis.

Haben Sie Fragen oder Anliegen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt SH POWER
Nathan Neukom
Bauleiter
052 635 12 78
nathan.neukom@shpower.ch

Kontakt Cellere AG
Werner Heller
Polier
079 214 53 28

Kontakt Cellere AG
Shajpran Krasniqi
Bauführer
052 644 80 80

Freundliche Grüsse
Ihre SH POWER

Baustellenportal

Gemeinde:	Schaffhausen	Kontrolliert:		FID:	2470
Projektname:	Langhansergässchen				
Projektname_Zusatz:					
Bereich:	Riethaldenweg bis Etzelstrasse				
Abacus Sammelnummer:		Sichtbarkeit:	No		
Status:	In Ausführung	Erfasst von:	Nikolina Oreskovic		
Budgetjahr:	2023	Priorität:	1		
Bauleiter-Modell:	ÖFFNEN	ÜBERNEHMEN	Baubeginn:	01.05.2024	
Bauleiter:	Urs Leu		Bauende ca.:		
Telefon_Nr:	052 635 14 52		Unternehmer:		
Bemerkungen:					
Hinweis Öffentlichkeit:	1. Etappe Wasser Baustart Februar 2024				



Langhansergässchen

Schaffhausen

Ausführung	Wir bauen, damit wir Sie heute und in Zukunft zuverlässig versorgen können. Hier finden Sie Informationen zum Bauprojekt: Langhansergässchen
Status	In Ausführung
Auskunft	Urs Leu
Telefon	 052 635 14 52
Mail	 BAUSTELLEN@SHPOWER.CH
Hinweis	1. Etappe Wasser Baustart Februar 2024
Einschränkungen	Strassen im Perimeter sind für den Verkehr abschnittsweise gesperrt. Wir sind bestrebt, die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Für allfällige Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Verständnis.

Baustellenportal



Fragen?
